

## INFORMASJON

Prosjekt Nygårdsgaten 91-93 er nå godt i gang med grunnarbeidet. Dette vil fortsette også i den neste måneden. I de neste 4 ukene vil vi fortsette med å grave ut tomten hvor det også skal etableres en kjørevei ned til byggetomten gjennom Johannes Bruns gate.

I den forbindelse vil det være en del anleggstrafikk både i og rundt byggeplassen i denne perioden.

Oppstart med peler er planlagt i uke 19 og det kan da i periodevis bli noe støy.

Montering av byggekranen vil foregå i begynnelsen av mai.

Arbeidstid vil hovedsakelig være fra 07:00 til 19:00

## PLAN FOR SIKRINGSTILTAK

Under utbyggingen vil det alltid være stort fokus på HMS og nødvendige sikringstiltak vil bli ivarettatt.

- Ingen utenforstående må ta seg inn på byggeområdet uten etter særlig avtale med og i følge med byggeplassledelsen
- Byggeplassen er sikret med skilting, inngjerding og gode rutiner.
- En gang i måneden vil det bli sendt ut skriftlig informasjon til nabolaget.



## PROSJEKTORGANISASJON

### LAB's organisasjon

Prosjektleder: Knut Helge Iversen

Tlf: 901 50 473

Mail: ki@lab.no

Anleggsleder: Jens Nordtveit

tlf :97 147 858

Mail: jn@lab.no

### Byggherrens organisasjon:

Byggherre: Entra

Prosjektleder: Magnar Rusten

Tlf: 905 76 210

Mail: mr@stema-r.no



## Nygårdsgaten 91-93

Prosjektinfo til naboer 1.mars-

1.juni

### PLANLAGT AKTIVITET DE NESTE 12 UKENE

#### Grunnarbeid:

- Uke 15-21: utgraving/klargjøring byggetomt
- Uke 15-18: Etablering av tilkomstvei i Johannes Bruns gate

#### Fundamentering:

- Uke 19-22: Peler

#### Betongarbeid


- Uke 23 Oppstart betong

#### Rigg

- Uke 18 Montering av tårnkran



*Uvedkommende skal ikke ta seg inn på byggeplassen*

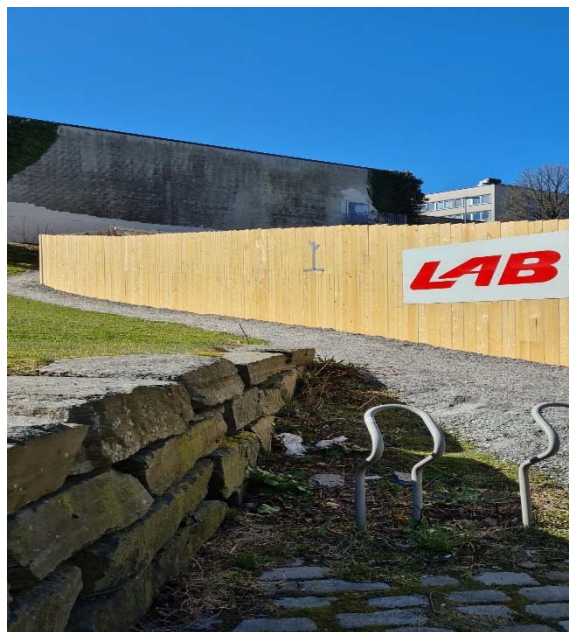

*Ny gangsti er etablert fra Nygårdsgaten og langs byggejerdet opp mot UIB*



*Prosjekt Nygårdsgaten 91-93*



*Utgraving av tomten er godt i gang*



*Prosjekt nygårdsgaten 91-93*
